



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België
BTW BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC GEBABEBB
Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel. +32 3 221 86 11 - antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART VERACHTERT, Electriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT / 15 / 60796851 / 00 / NL / 001
Klantref.: 89729001
Contractref.: 2136647/1000

• Uw gegevens

Ref.: Order Intake /

M. Cappelle Werner

Silsburgstraat, 75
2100 Deurne
Belgie

• Interventiegegevens

Plaats: De Robianostraat 21 2de verdiep 2150 Borsbeek -
Datum: 06/01/2020
Uitgevoerd door: KEVIN VERBEECK (3076)

15001

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK E
CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINS**

INSTALLATIE

Naam: Somers Voornaam: Tessa
Adres: De Robianostraat 21 2de verdiep Post nr.: 2150 Stad: Borsbeek
Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: M. Cappelle Werner Voornaam:
Identiteitskaart nr.: , uitgereikt op te
BTW nr.: BE 0700150651

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 276bis: verkoop van een wooneenheid

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 06/01/2045.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



Blz. 2 / 2
Verslag nr.: ANT / 15 / 60796851 / 00 / NL / 001
Contractref.: 2136647/1000

..... C

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsned respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 16.9 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >10 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een fouts

15001

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: 541448820040196099
Bescherming aansluiting: 40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type: VOB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 2 x 6 mm²
Type aardelektrode: pen / baar

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A300mA
Aantal borden: 2
Aantal eindstroombanen: 9
Situatieschema('s): zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s): zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie


- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)

3

Kast appartement

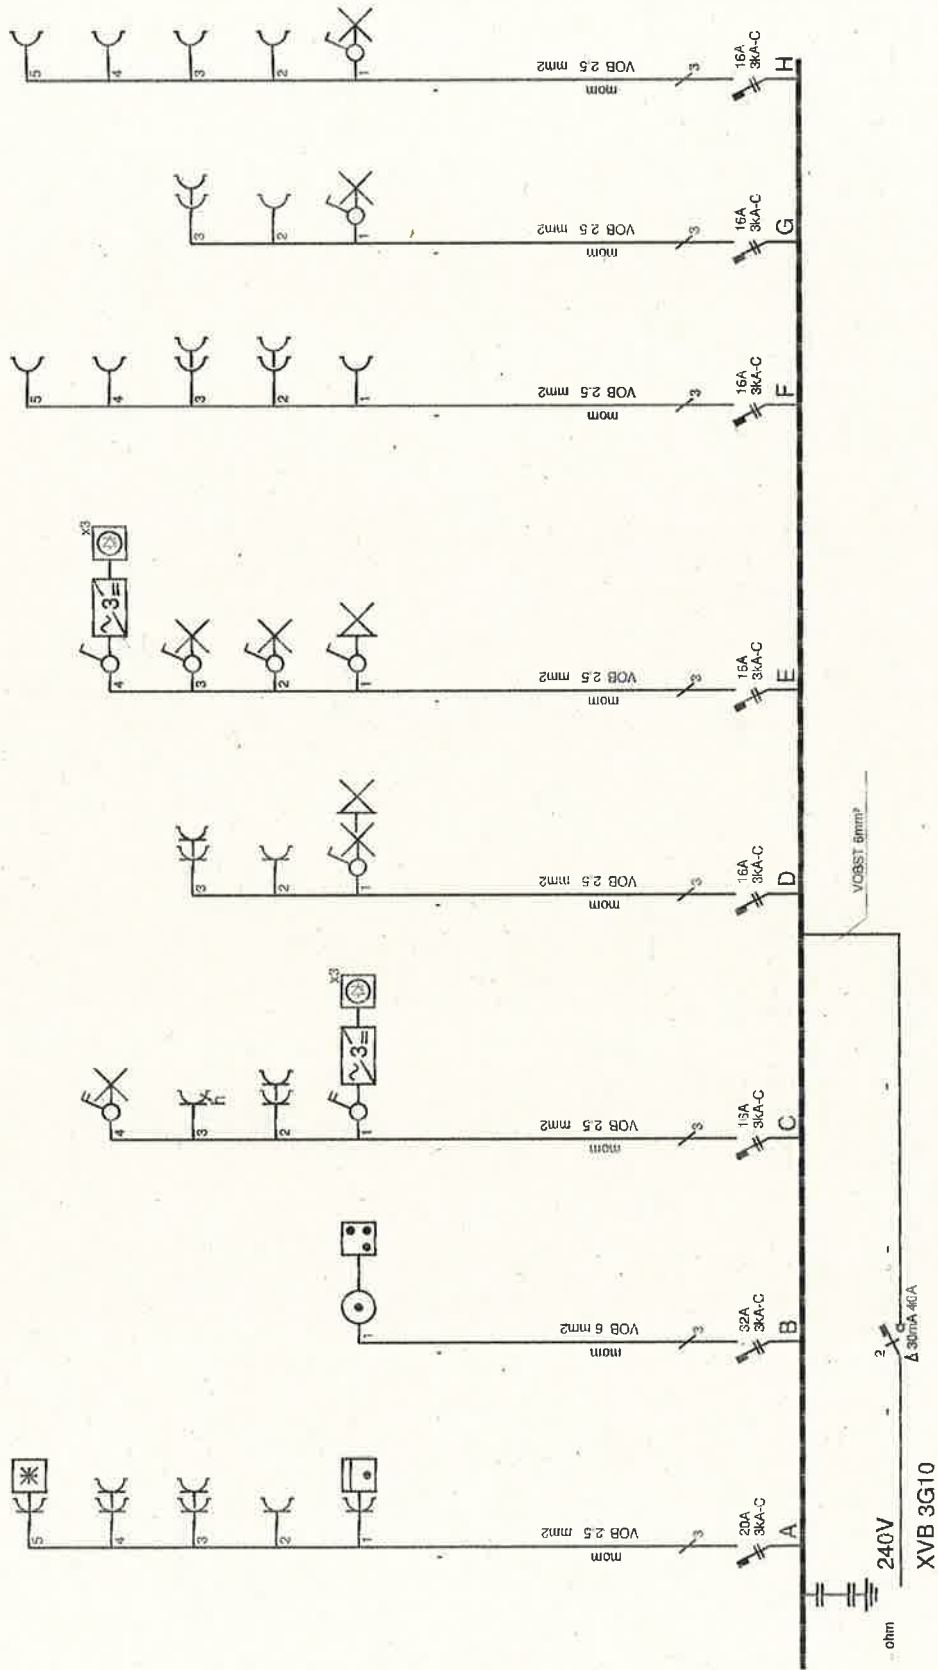

Afgev. erkend organisme
06 / 01 / 2020



Tessa Somers
De Robianostraat 21
2150 Borsbeek
541448820040196099

Verantw. uitvoering
06 / 01 / 2020

Werner Cappelle
Silsburgstraat 75, Deurne
Tel: 0477.32.74.46
BE 0700.150.651

